


Ablauf- und Terminplan "Kiesabbauprojekt" (Konzentrationsmodell: Nutzungsplanung - Baugesuch - Umweltverträglichkeitsprüfung)

Koordiniertes Verfahren

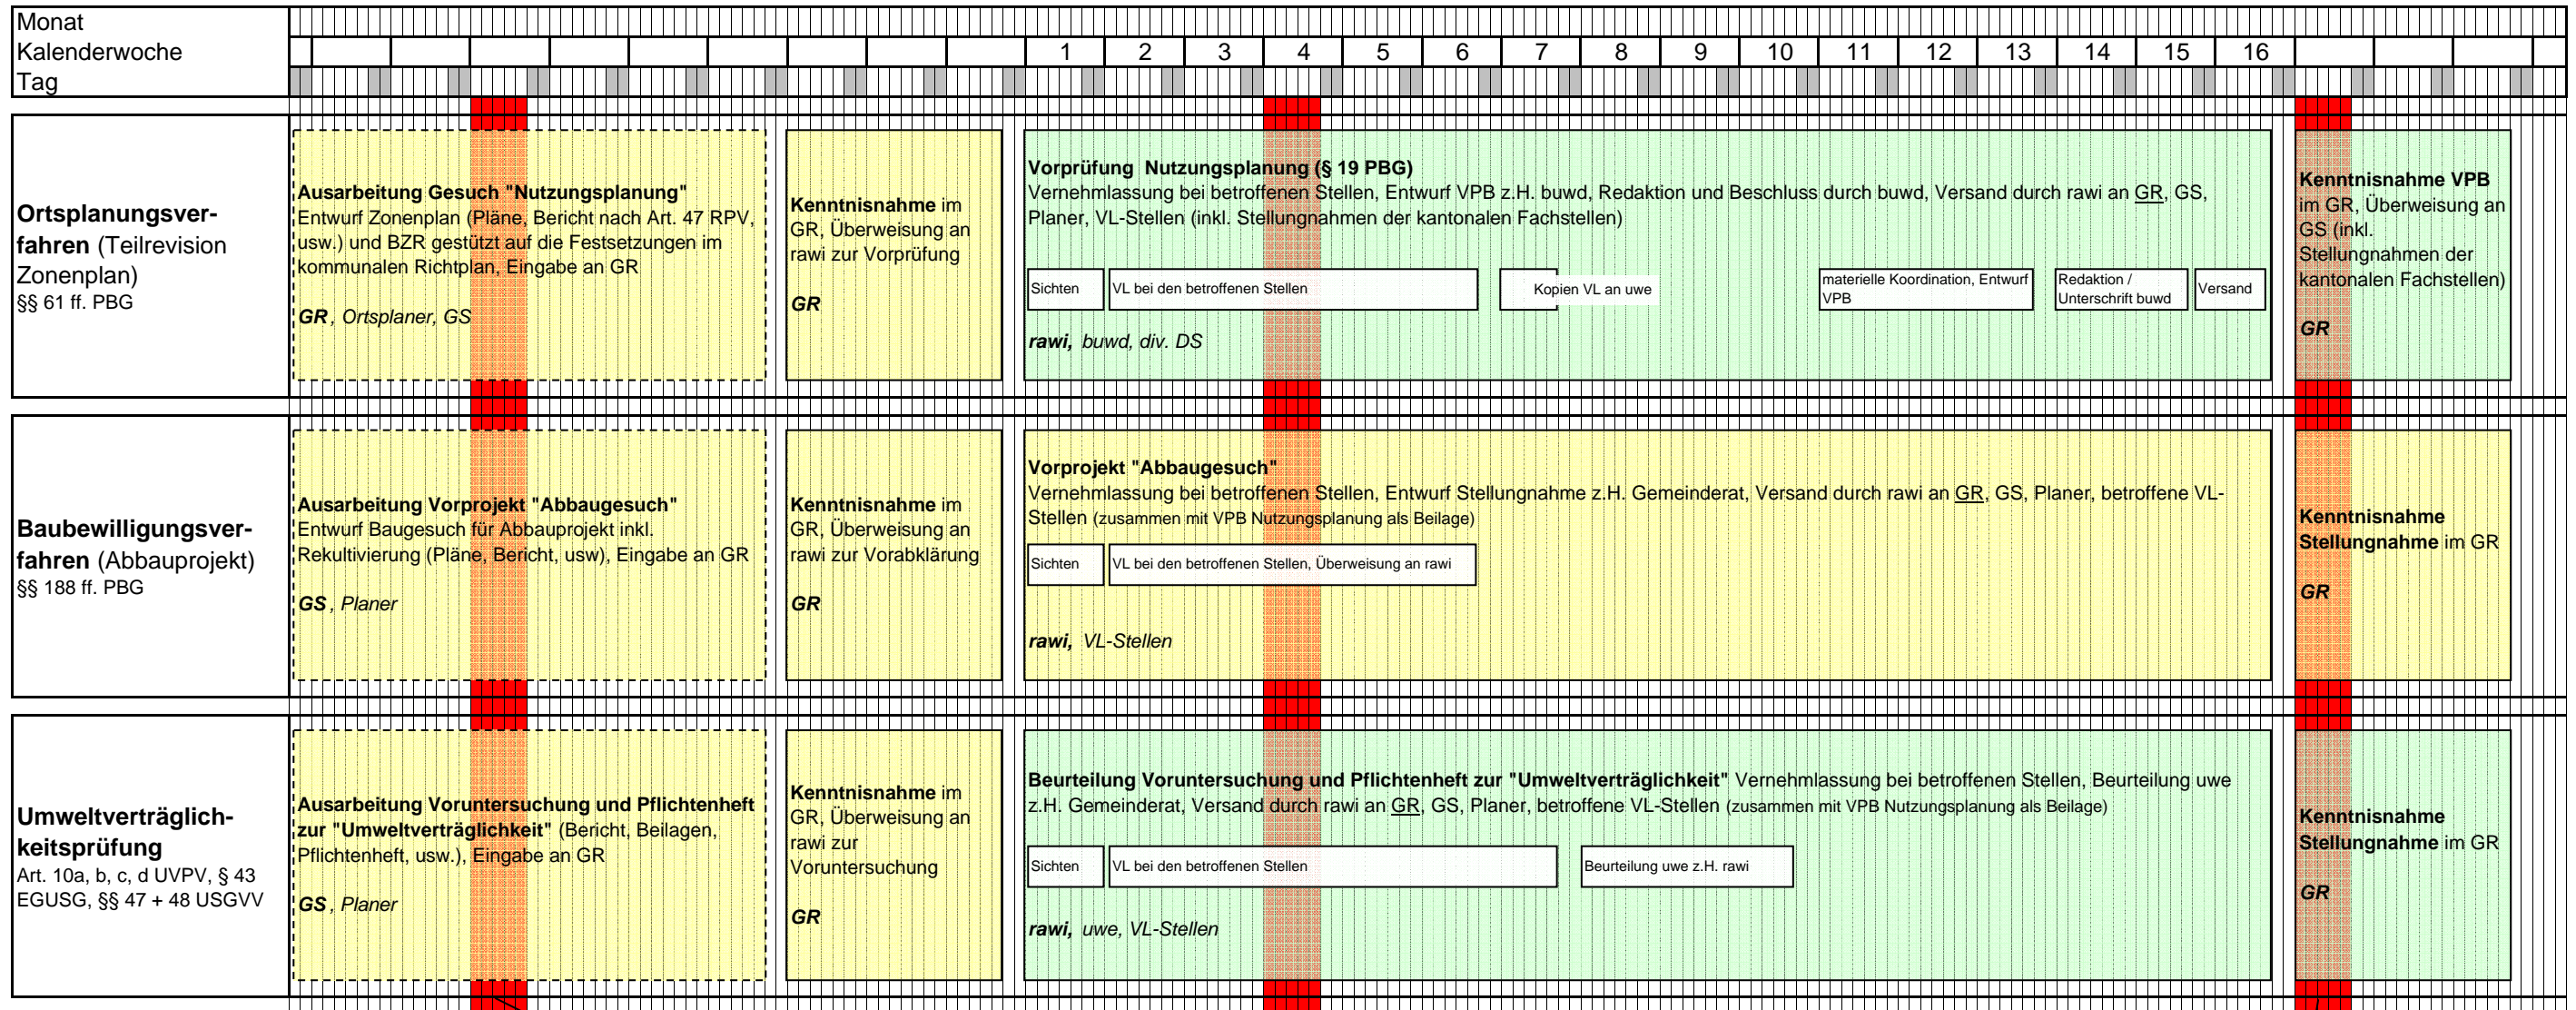


Startsitzung, möglichst frühzeitig auf Antrag GR, GS oder Planer
 - Information über Projekt
 - Hinweise zum Verfahren
 - Festlegen verfahrensleitende Massnahmen
 GR, rawi

1. Koordinationssitzung
 - Hinweise zum VPB und der Stellungnahme
 - Diskussion / Begründung der Anträge
 - Festlegen weiteres Vorgehen
 rawi, GR, VL-Stellen, GS, Planer

Bilaterale Besprechungen bei Bedarf, nach Versand VPB und Stellungnahme
 rawi, GR, VL-Stellen, GS, Planer

Ablauf- und Terminplan "Kiesabbauprojekt" (Konzentrationsmodell: Nutzungsplanung - Baugesuch - Umweltverträglichkeitsprüfung)

Koordiniertes Verfahren

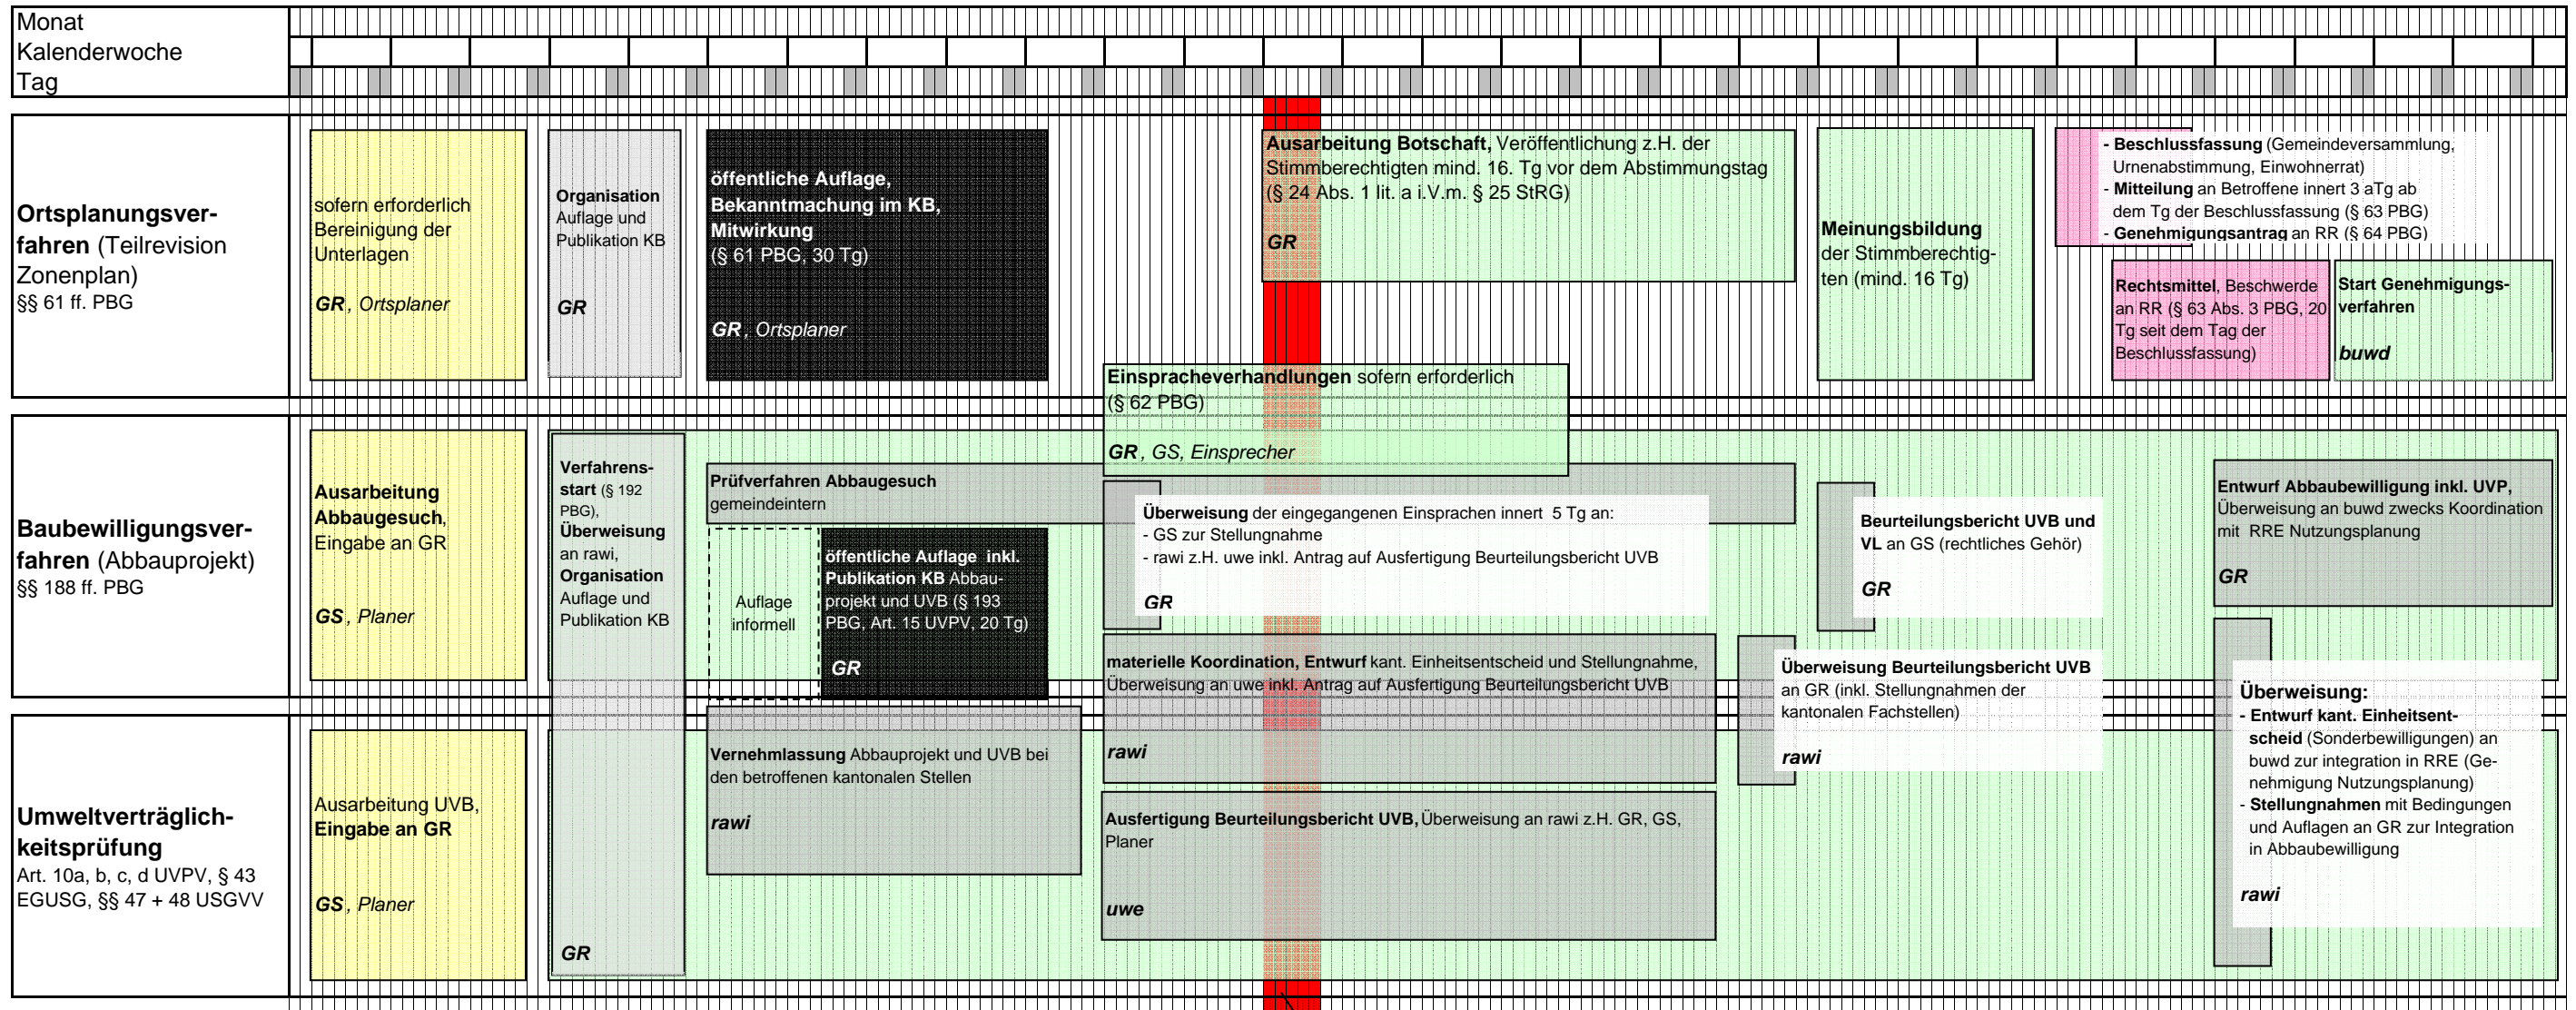

Legende

- GS Gesuchsteller/in
- GR Gemeinderat
- RR Regierungsrat
- buwd Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
- rawi Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation
- uwe Dienststelle Umwelt und Energie
- VL-Stellen Vernehmlassungsstellen
- KB Kantonsblatt
- VPB Vorprüfungsbericht
- PBG Planungs- und Baugesetz
- UVPV Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung

- Projektierungs- / Vorabklärungsphase
- Prüf- / Beurteilungsphase
- Entscheidungsphase
- Beschwerdephase
- Zeitpunkt für Koordinationssitzung

Stand Juni 08


3. Koordinationssitzung, nach der öffentlichen Auflage auf Antrag GR

- Diskussion betreffend Einsprachen
- Festlegen weiteres Vorgehen

GR, rawi, GS, Planer, VL-Stellen

Ablauf- und Terminplan "Kiesabbauprojekt" (Konzentrationsmodell: Nutzungsplanung - Baugesuch - Umweltverträglichkeitsprüfung)

Koordiniertes Verfahren

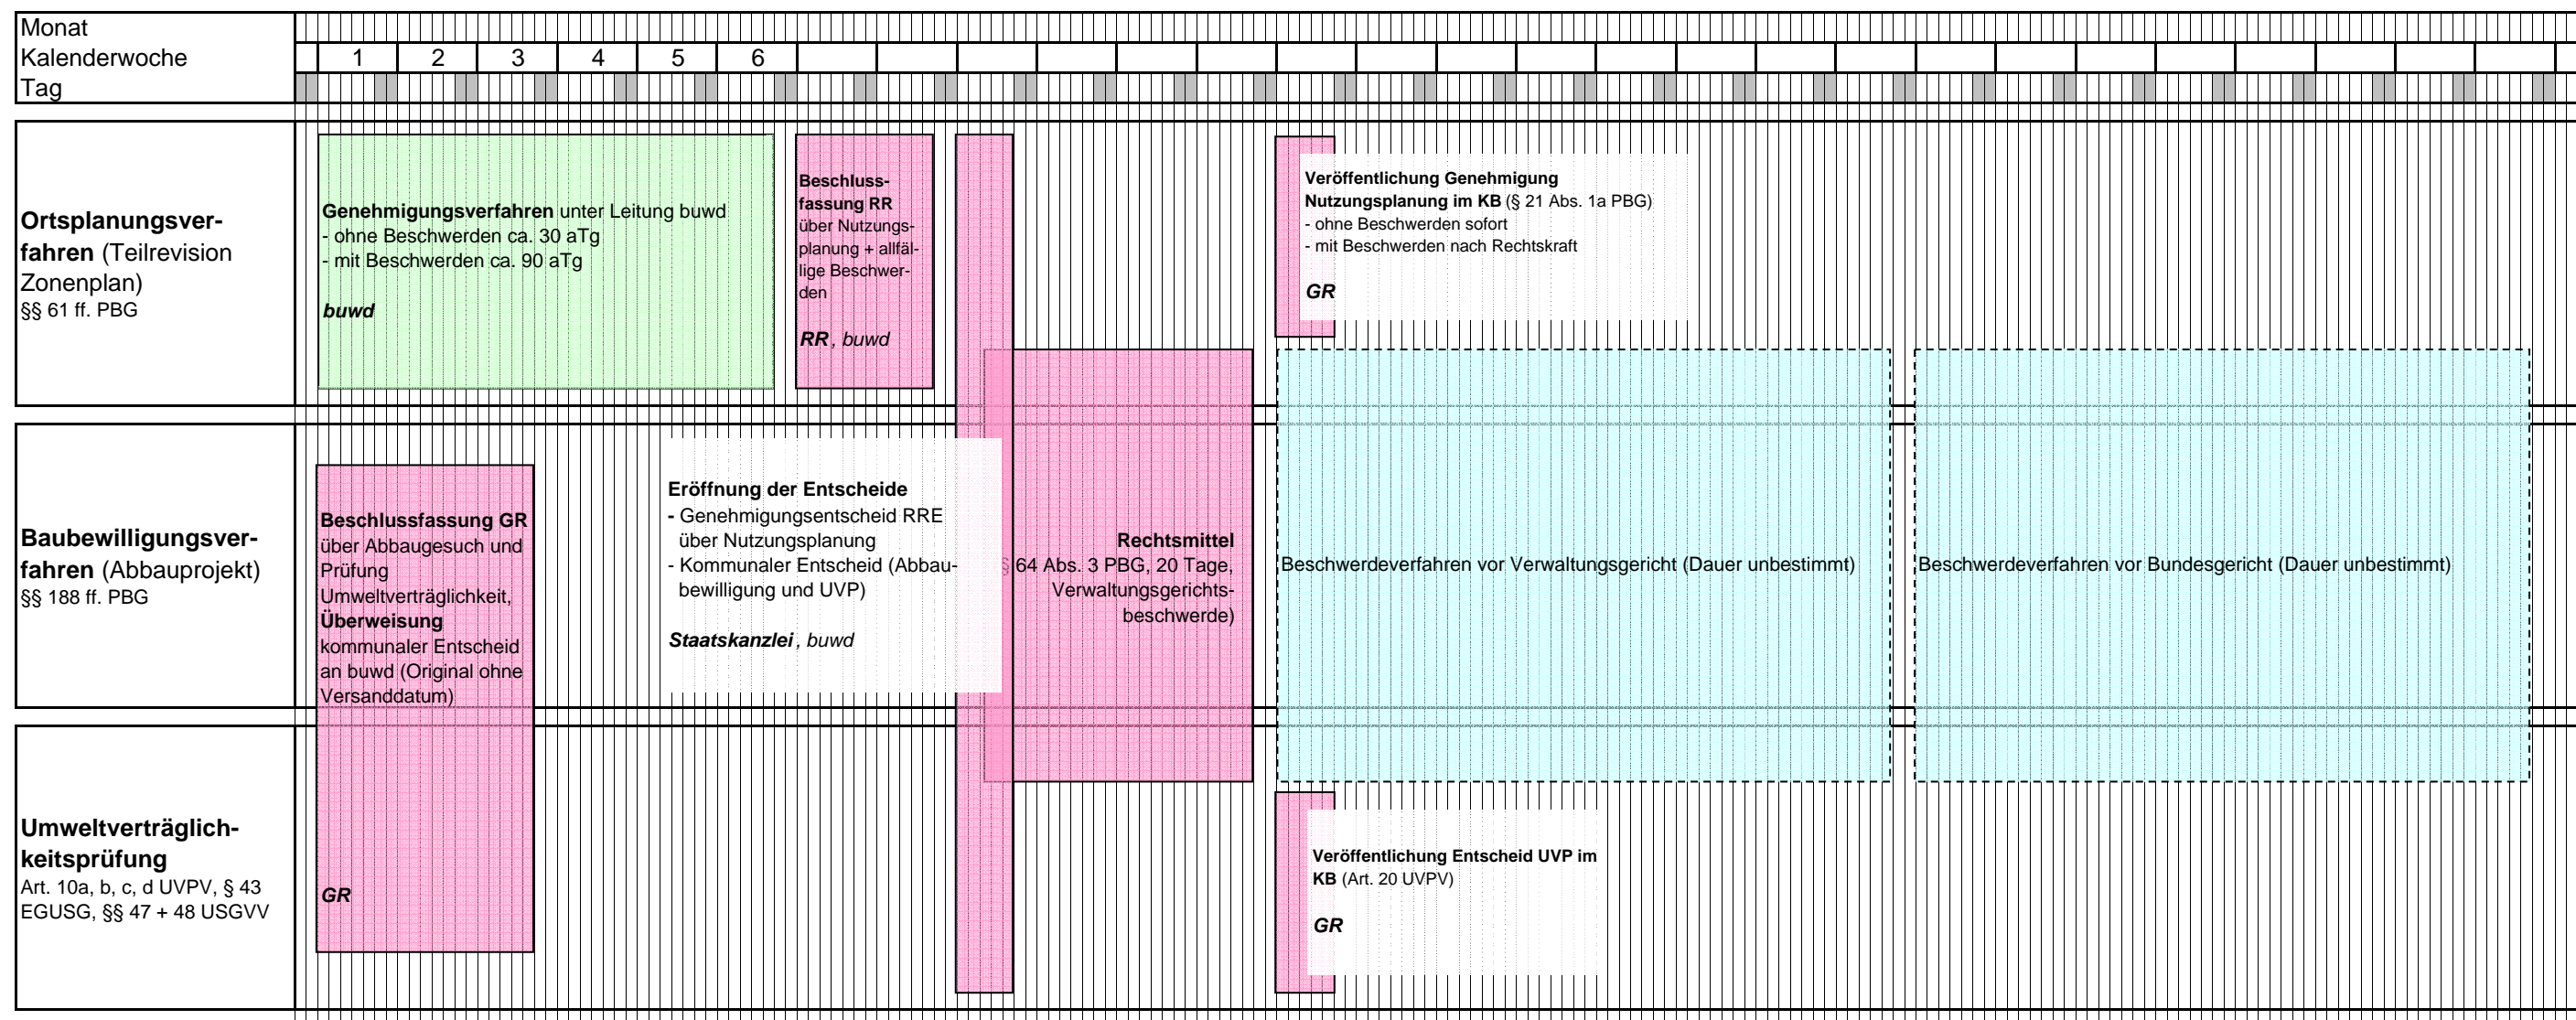

Legende

- GS Gesuchsteller/in
- GR Gemeinderat
- RR Regierungsrat
- buwd Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
- rawi Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation
- uwe Dienststelle Umwelt und Energie
- VL-Stellen Vernehmlassungsstellen
- KB Kantonsblatt
- VPB Vorprüfungsbericht
- PBG Planungs- und Baugesetz
- UVPV Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung

- Projektierungs- / Vorabklärungsphase
- Prüf- / Beurteilungsphase
- Entscheidungsphase
- Beschwerdephase
- Zeitpunkt für Koordinationssitzung

Stand Juni 08
